



PEDESTAL	NIVEL	PEDESTAL	NIVEL	PEDESTAL	NIVEL	PEDESTAL	NIVEL	PEDESTAL	NIVEL	PEDESTAL	NIVEL	PEDESTAL	NIVEL	PEDESTAL	NIVEL	PEDESTAL	NIVEL
1	+ 4.75	14	+ 4.867	27	+ 4.984	40	+ 5.101	53	+ 5.218	66	+ 5.335	79	+ 5.452	92	+ 5.569	105	+ 5.686
2	+ 4.759	15	+ 4.876	28	+ 4.993	41	+ 5.11	54	+ 5.227	67	+ 5.344	80	+ 5.461	93	+ 5.578	106	+ 5.695
3	+ 4.768	16	+ 4.885	29	+ 5.002	42	+ 5.119	55	+ 5.236	68	+ 5.353	81	+ 5.47	94	+ 5.587	107	+ 5.704
4	+ 4.777	17	+ 4.894	30	+ 5.011	43	+ 5.128	56	+ 5.245	69	+ 5.362	82	+ 5.479	95	+ 5.596		
5	+ 4.786	18	+ 4.903	31	+ 5.02	44	+ 5.137	57	+ 5.254	70	+ 5.371	83	+ 5.488	96	+ 5.605		
6	+ 4.795	19	+ 4.912	32	+ 5.029	45	+ 5.146	58	+ 5.263	71	+ 5.38	84	+ 5.497	97	+ 5.614		
7	+ 4.804	20	+ 4.921	33	+ 5.038	46	+ 5.155	59	+ 5.272	72	+ 5.389	85	+ 5.506	98	+ 5.623		
8	+ 4.813	21	+ 4.93	34	+ 5.047	47	+ 5.164	60	+ 5.281	73	+ 5.398	86	+ 5.515	99	+ 5.632		
9	+ 4.822	22	+ 4.939	35	+ 5.056	48	+ 5.173	61	+ 5.29	74	+ 5.407	87	+ 5.524	100	+ 5.641		
10	+ 4.831	23	+ 4.948	36	+ 5.065	49	+ 5.182	62	+ 5.299	75	+ 5.416	88	+ 5.533	101	+ 5.65		
11	+ 4.84	24	+ 4.957	37	+ 5.074	50	+ 5.191	63	+ 5.308	76	+ 5.425	89	+ 5.542	102	+ 5.659		
12	+ 4.849	25	+ 4.966	38	+ 5.083	51	+ 5.20	64	+ 5.317	77	+ 5.434	90	+ 5.551	103	+ 5.668		
13	+ 4.858	26	+ 4.975	39	+ 5.092	52	+ 5.209	65	+ 5.326	78	+ 5.443	91	+ 5.56	104	+ 5.677		


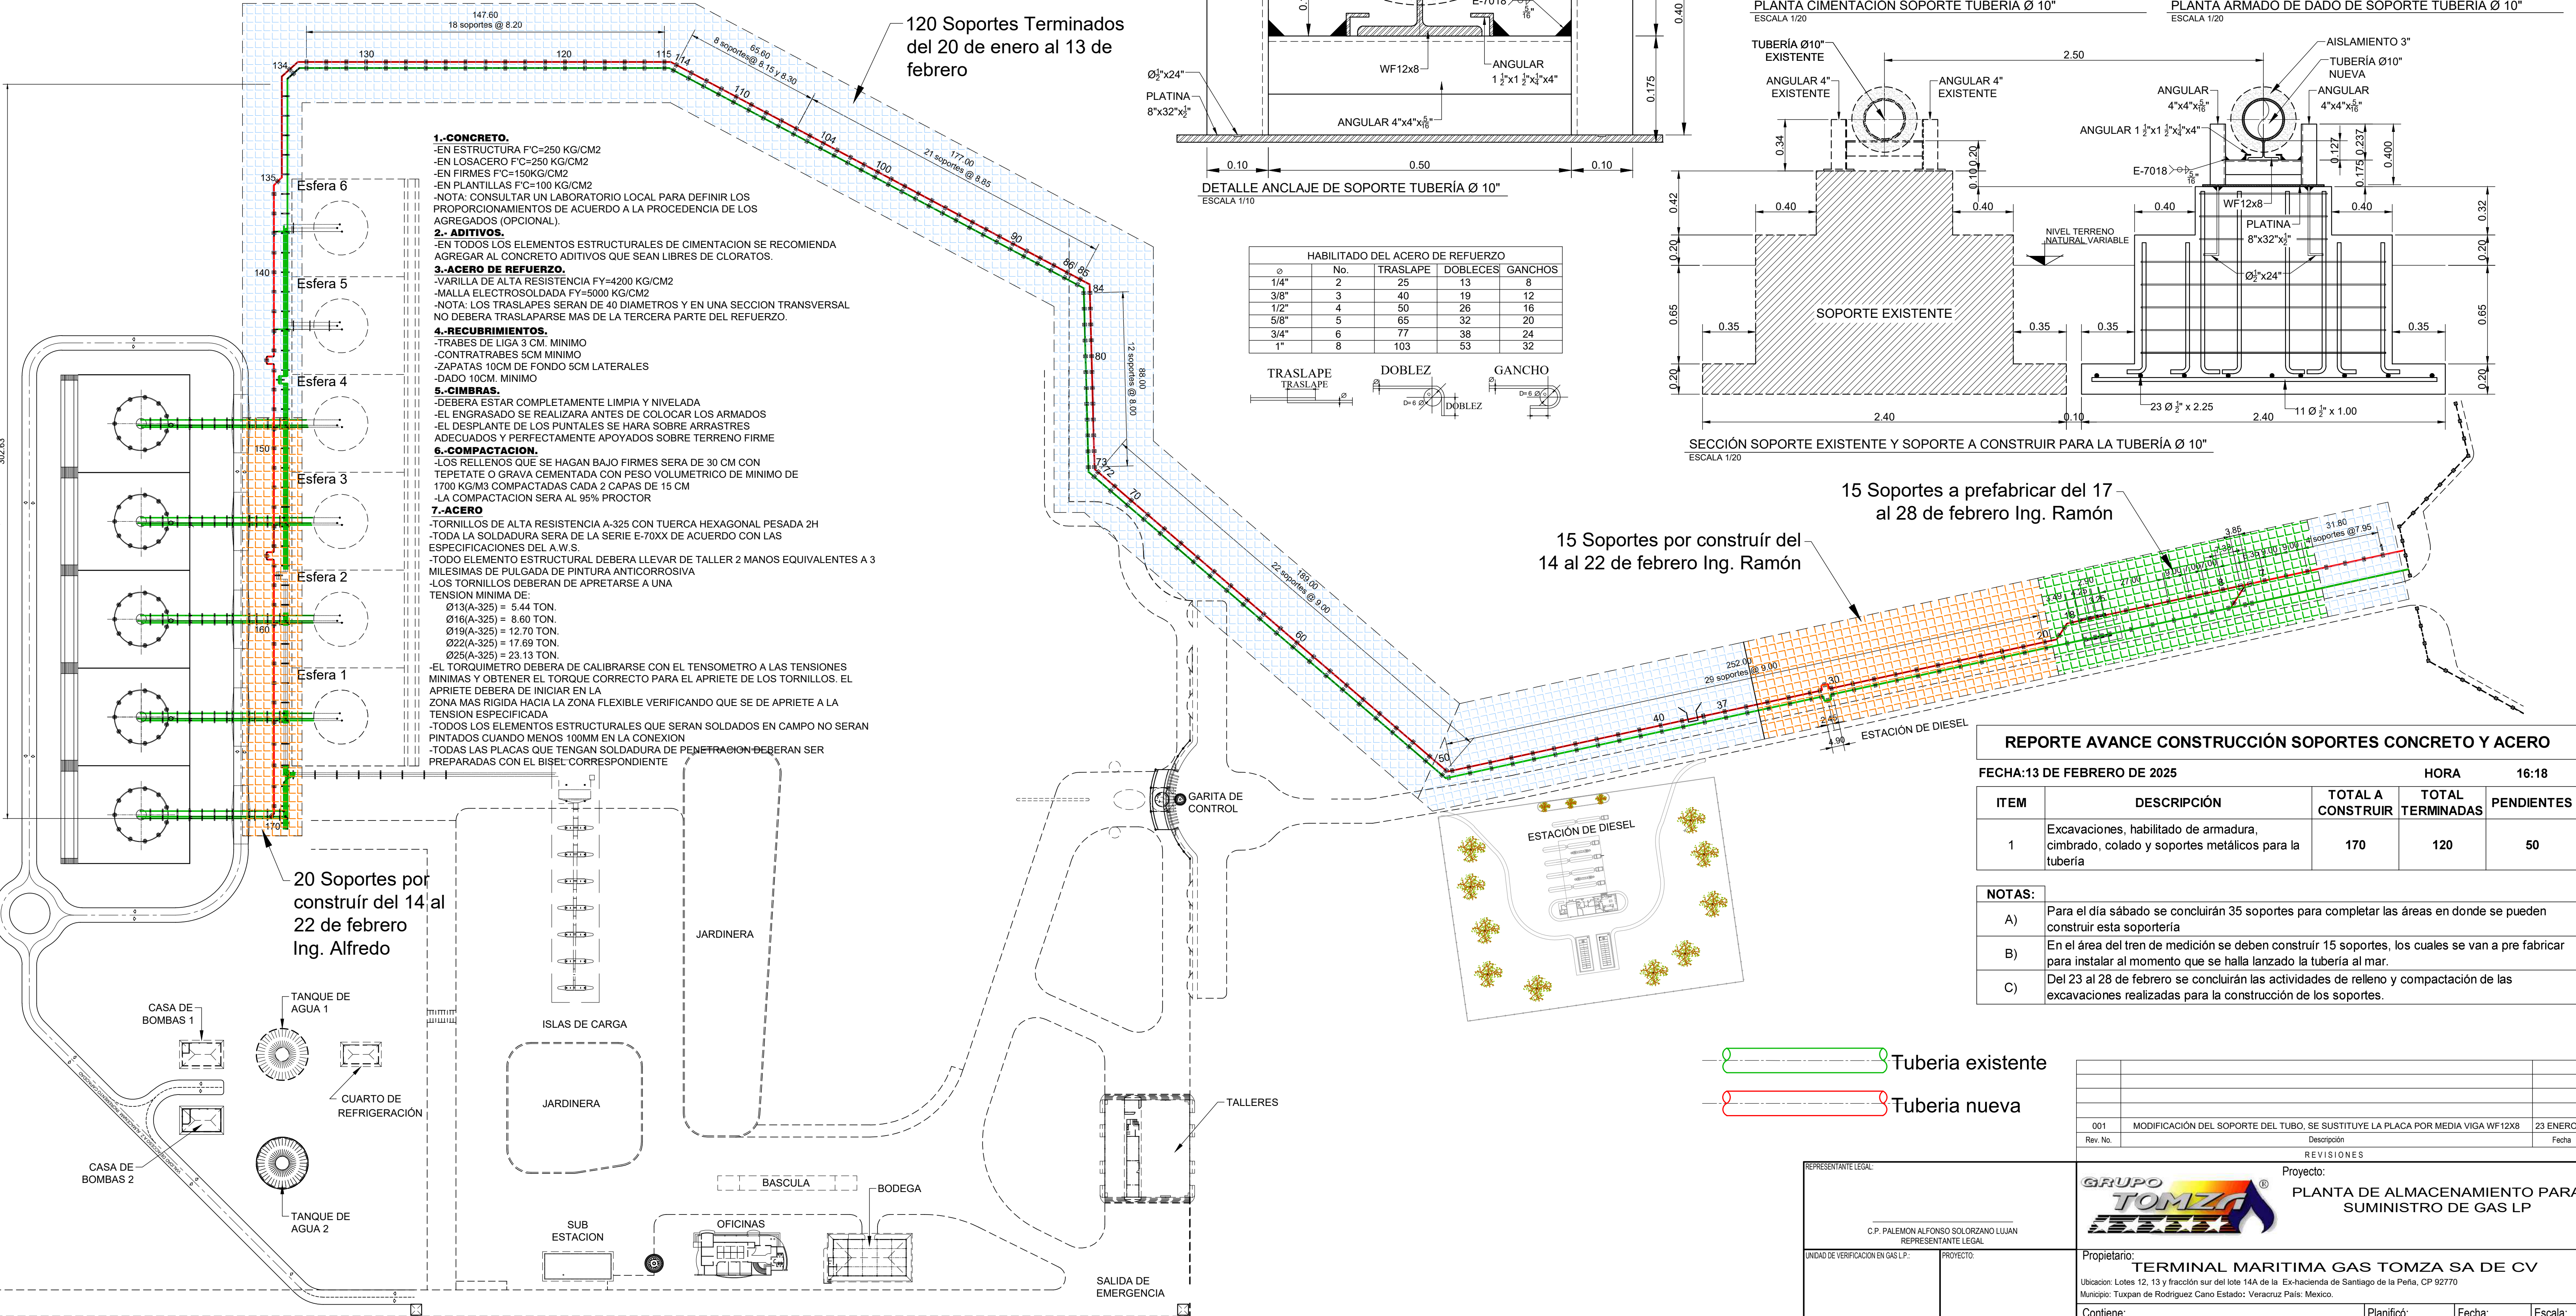


1 PLANO GENERAL DE CONJUNTO
ESCALA 1:250

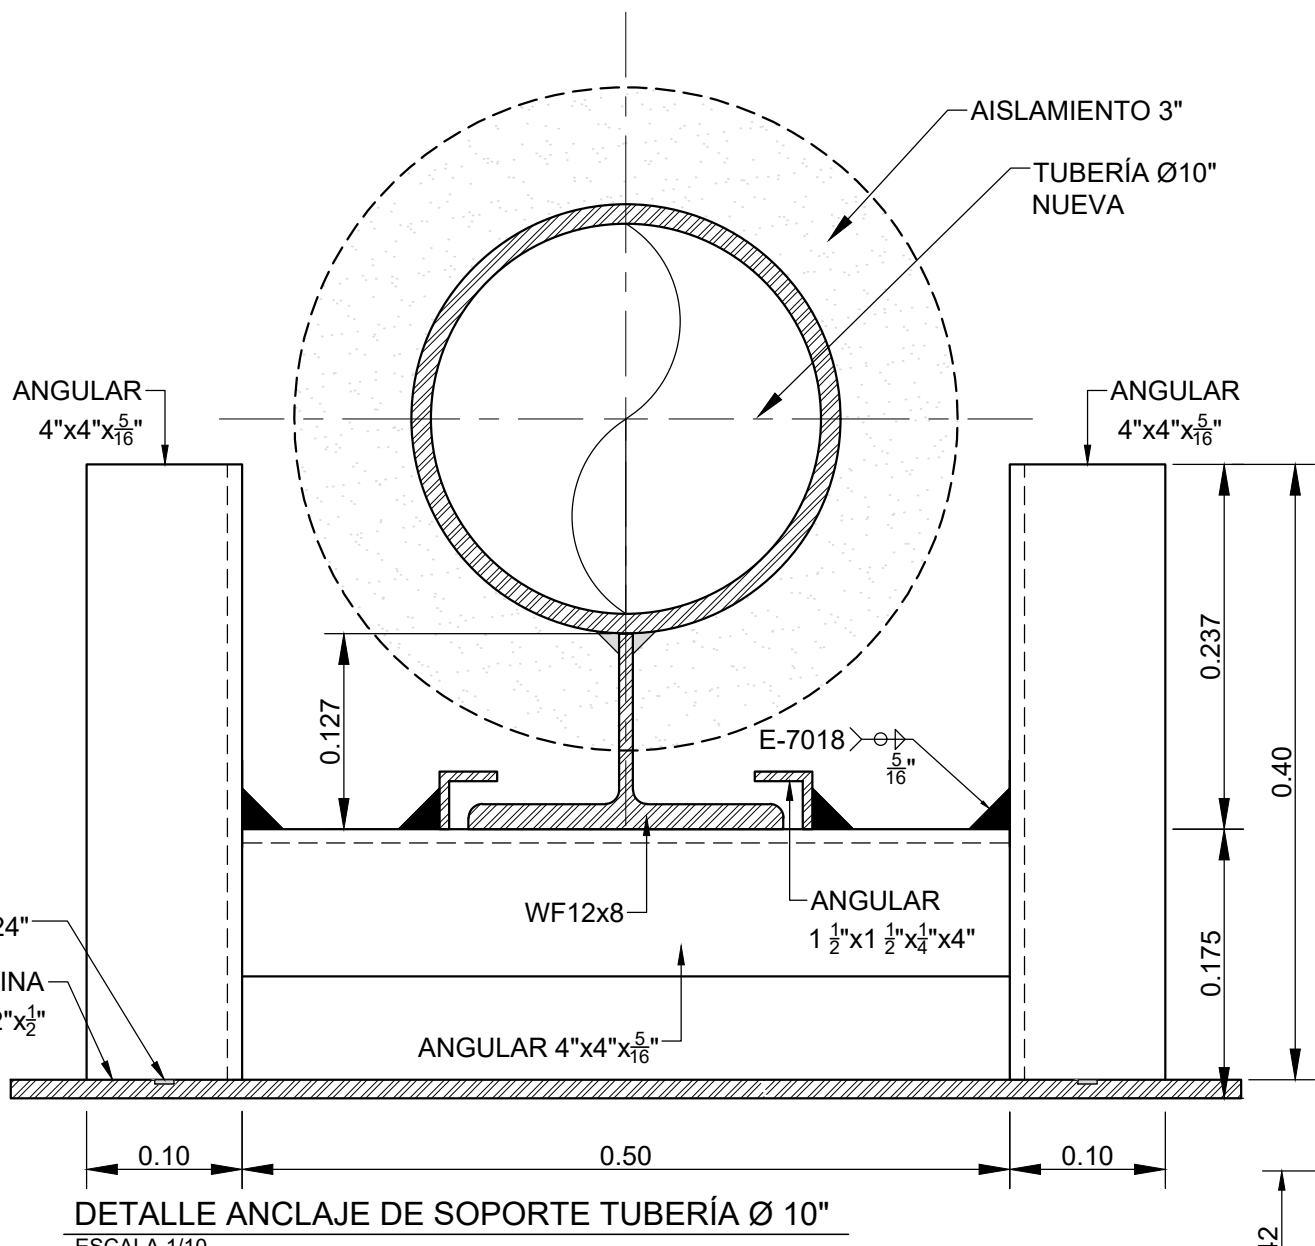

Ø	No.	TRASLAPE	DOBLECES	GANCHOS
1/4"	2	25	13	8
3/8"	3	40	19	12
1/2"	4	50	26	16
5/8"	5	65	32	20
3/4"	6	77	38	24
1"	8	103	53	32

TRASLAPE DOBLEZ GANCHO

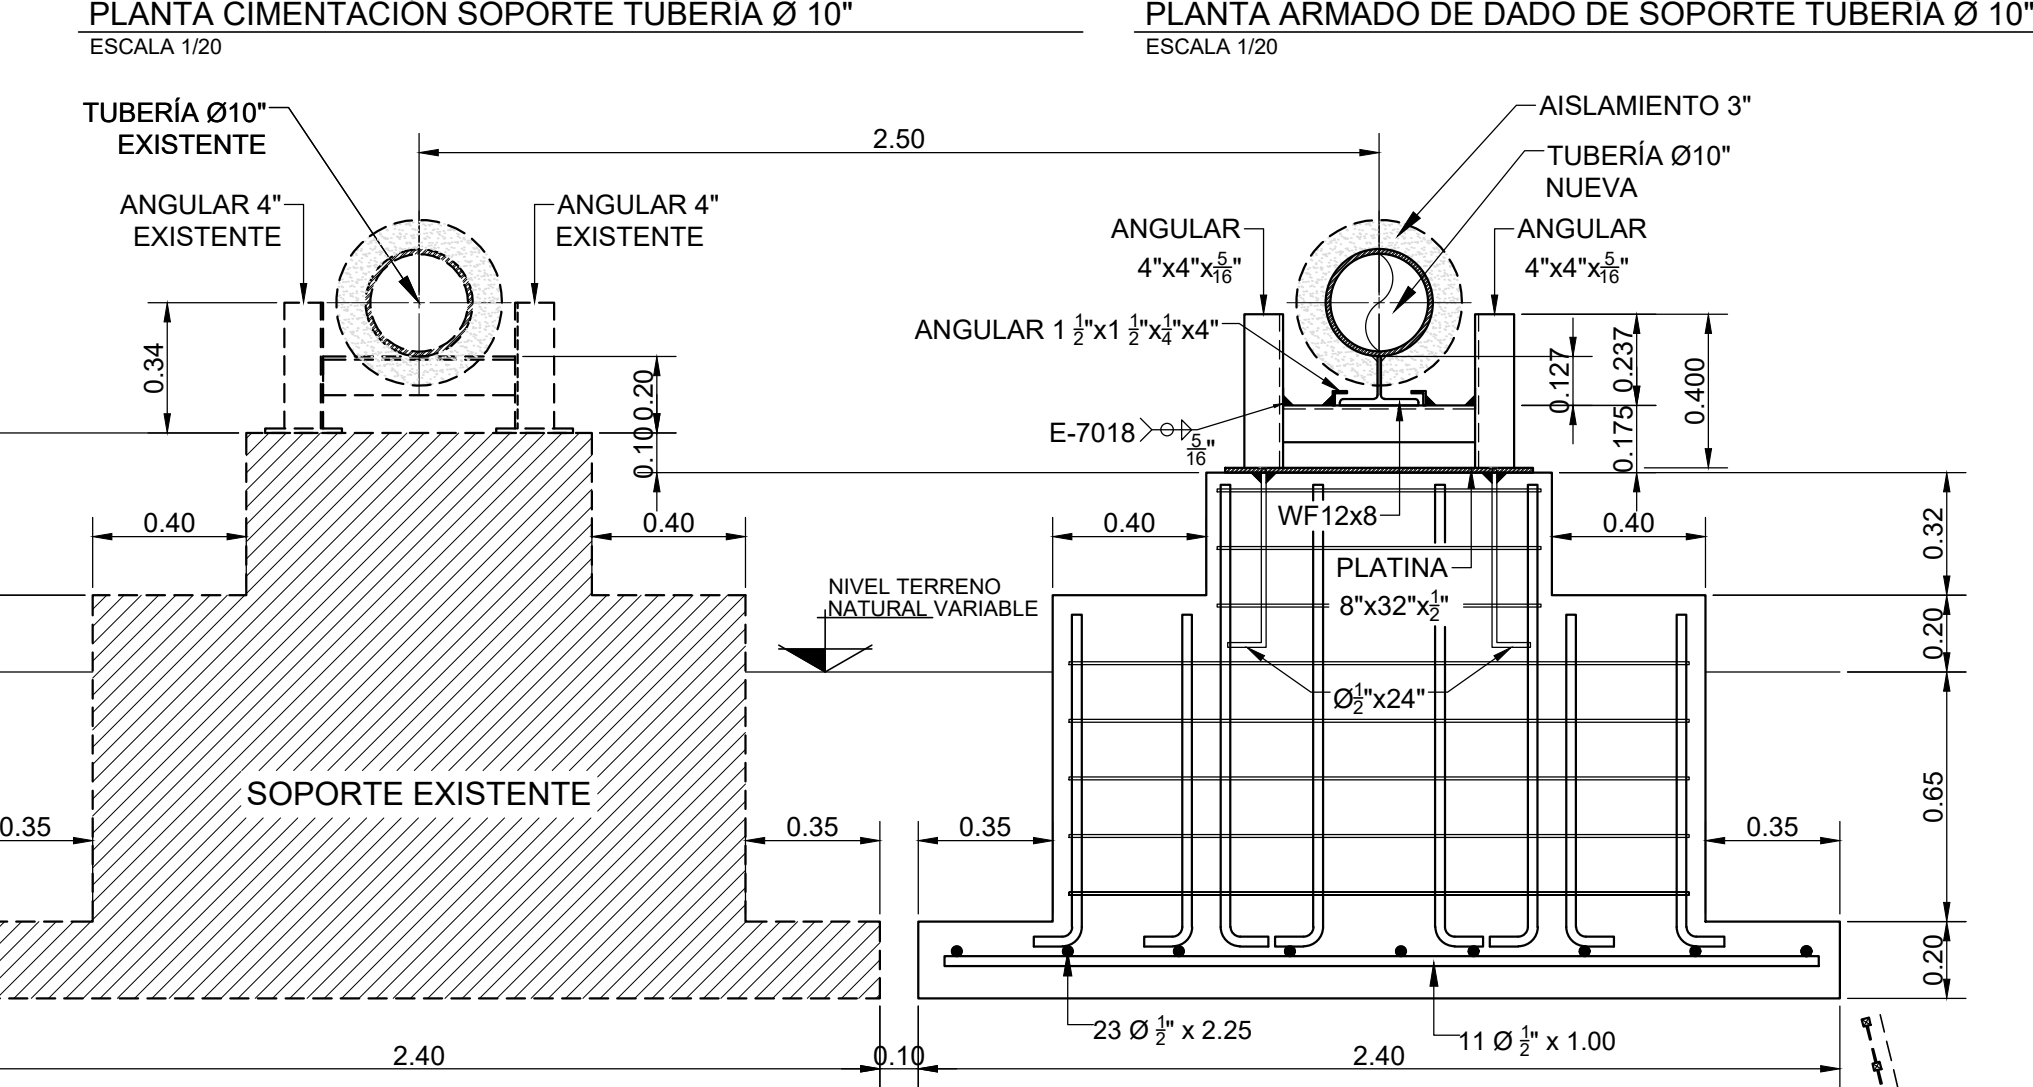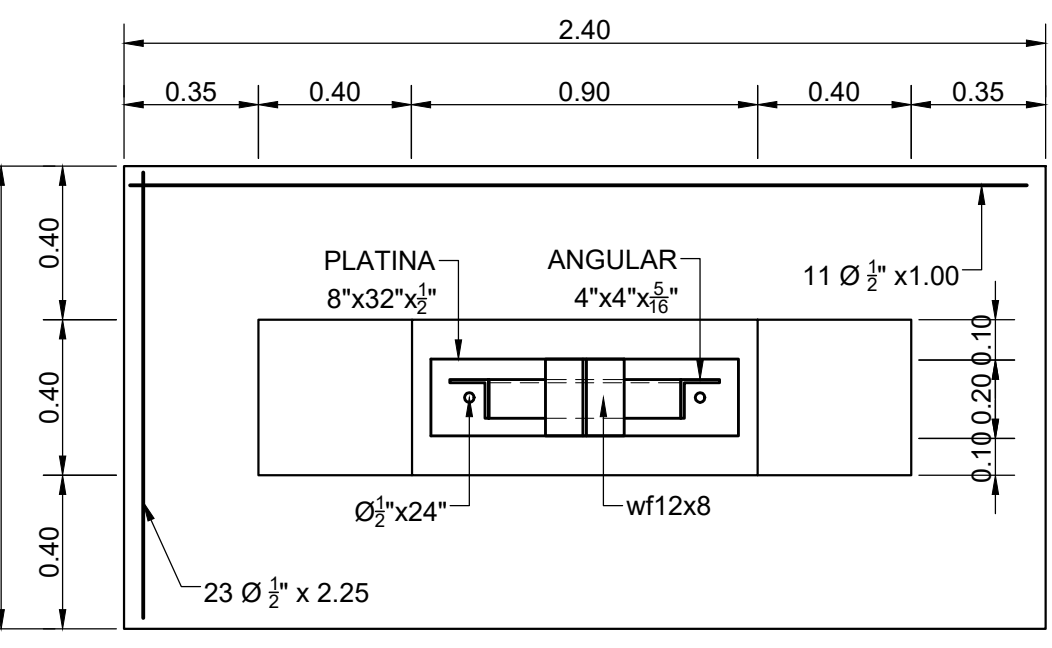

REPORTE AVANCE CONSTRUCCIÓN SOPORTES CONCRETO Y ACERO

FECHA:13 DE FEBRERO DE 2025			HORA:16:18	
ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL A CONSTRUIR	TOTAL TERMINADAS	PENDIENTES
1	Excavaciones, habilitado de armadura, cimbrado, colado y soportes metálicos para la tubería	170	120	50

NOTAS:	
A)	Para el día sábado se concluirán 35 soportes para completar las áreas en donde se pueden construir esta soportaría
B)	En el área del tren de medición se deben construir 15 soportes, los cuales se van a pre fabricar para instalar al momento que se halla lanzado la tubería al mar.
C)	Del 23 al 28 de febrero se concluirán las actividades de relleno y compactación de las excavaciones realizadas para la construcción de los soportes.

Tubería existente

Tubería nueva

REPRESENTANTE LEGAL:
C.P. PALEMON ALFONSO SOLORZANO LUJAN
REPRESENTANTE LEGAL

UNIDAD DE VERIFICACIÓN EN GAS L.P.:
PROYECTO:
PROFESIONAL
CEDULA PROFESIONAL:

GRUPO TOMZA

Proyecto:
PLANTA DE ALMACENAMIENTO PARA SUMINISTRO DE GAS LP

Propietario:
TERMINAL MARITIMA GAS TOMZA SA DE CV
Ubicación: Lotes 12, 13 y fracción sur del lote 14A de la Ex-hacienda de Santiago de la Peña, CP 92770
Municipio: Tuxpan de Rodríguez Cano Estado: Veracruz País: Mexico.

Contiene:
PLANO GENERAL
TRAYECTORIA DE TUBERÍAS Y UBICACIÓN DE SOPORTERIA Y DETALLES

Planificado:
Arg. Mario R. Solís

Fecha:
Febrero 2025

Revisión:
01

Escala:
1:250

Hoja No:
1 DE 1
